



Схема установки блоков на новую площадку

Шесть блоков 3 × 9 × 2,5 м, масса каждого 8,7 т. Шаланда перпендикулярно крану. Размеры в метрах.

План. Шаланда перпендикулярно крану

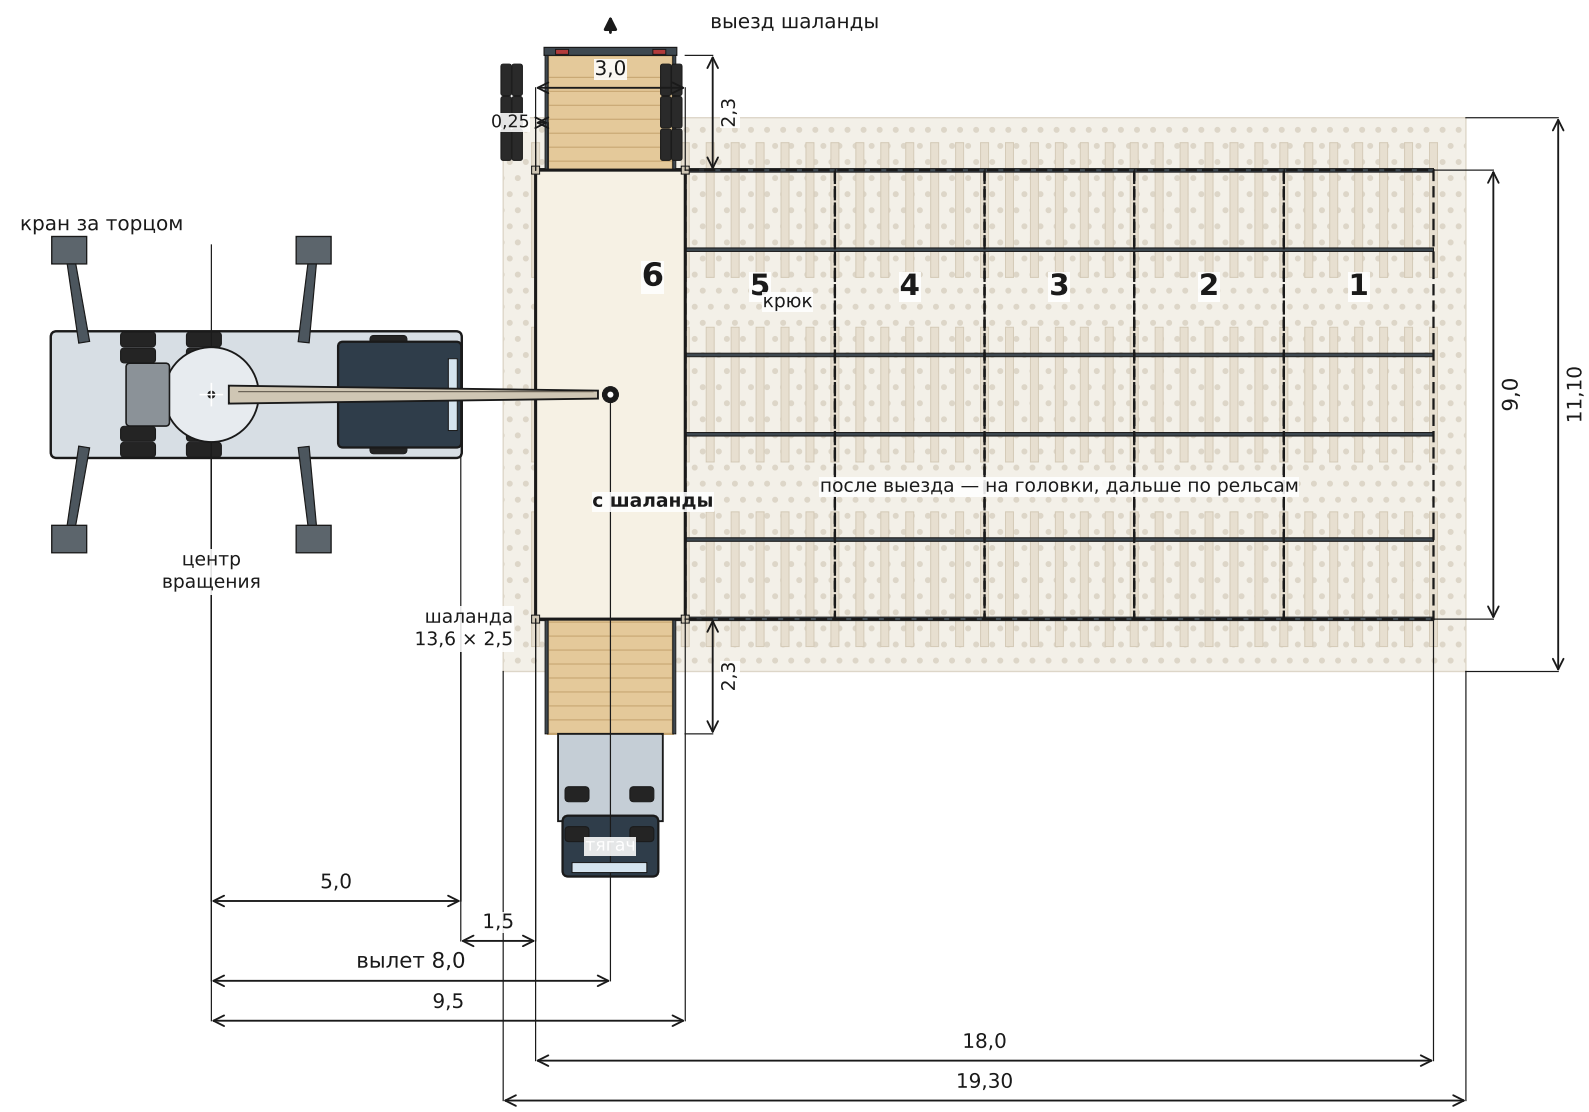

С шаланды на рельсы. Шаланда поперёк стрелы

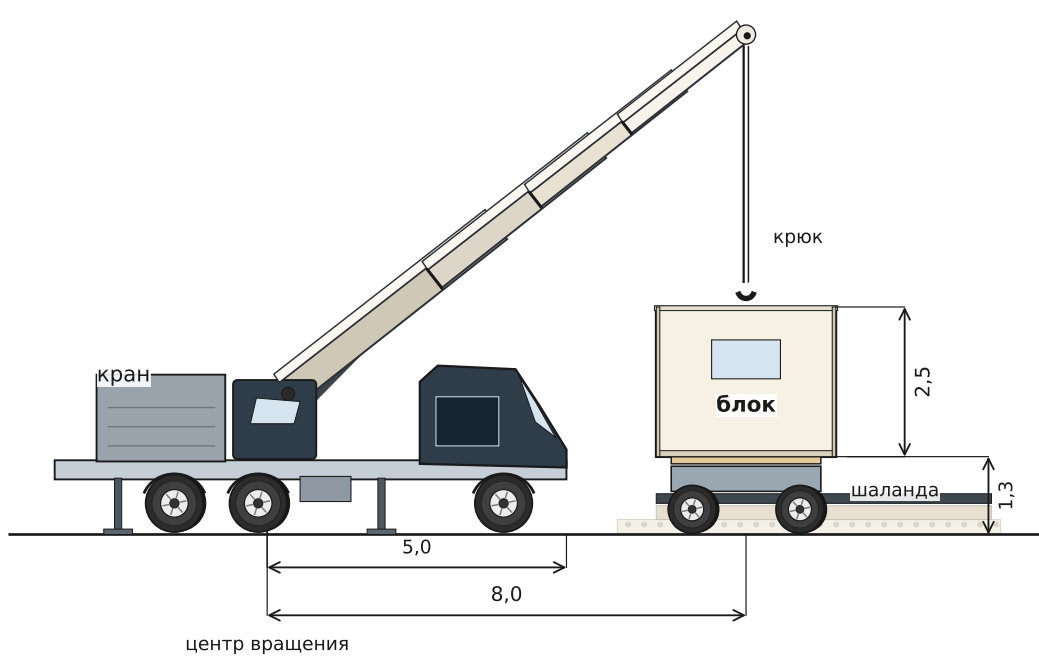

1. Шаланда 13,6 × 2,5 м стоит перпендикулярно кабине. Блок на ней: 9 м вдоль шаланды, 3 м вдоль стрелы. Тягач за бровкой. С этой шаланды блок берут и сажают на головки рельсов.
2. Кран за торцом, на шпалы не заезжает. Колея 2,05 и 1,89 м короче шпалы 2,70 м. Опоры полностью. Стрела только вперёд над кабиной. На подъёме и посадке с этой стоянки не переезжает.
3. 5,0 м до переда кабины сверяют обмером. Ближняя грань 6,5 м, середина — вылет 8,0 м, дальняя грань 9,5 м. Зазор кабины 1,5 м. На крюке 9,1 т. Стрела 14 м, при 8 м около 9,9 т. Строп 4СЦ — по схеме строповки.
4. После строповки шаланда выезжает по своей оси. В кабине и на платформе людей нет. Блок опускают на головки у торца. Дальше его передвигают по рельсам на своё место, кран со створа уходит. Следующая шаланда заезжает так же. Блоки вплотную. Модуль 18 × 9 м.
