



Схема передвижки блока экскаватором

Место погрузки. Блок 3 × 9 × 2,5 м, масса 8,7 т. Два крайних пути, машина между ними тянет только на себя. Размеры в метрах.

План. Два крайних пути, тяга на себя

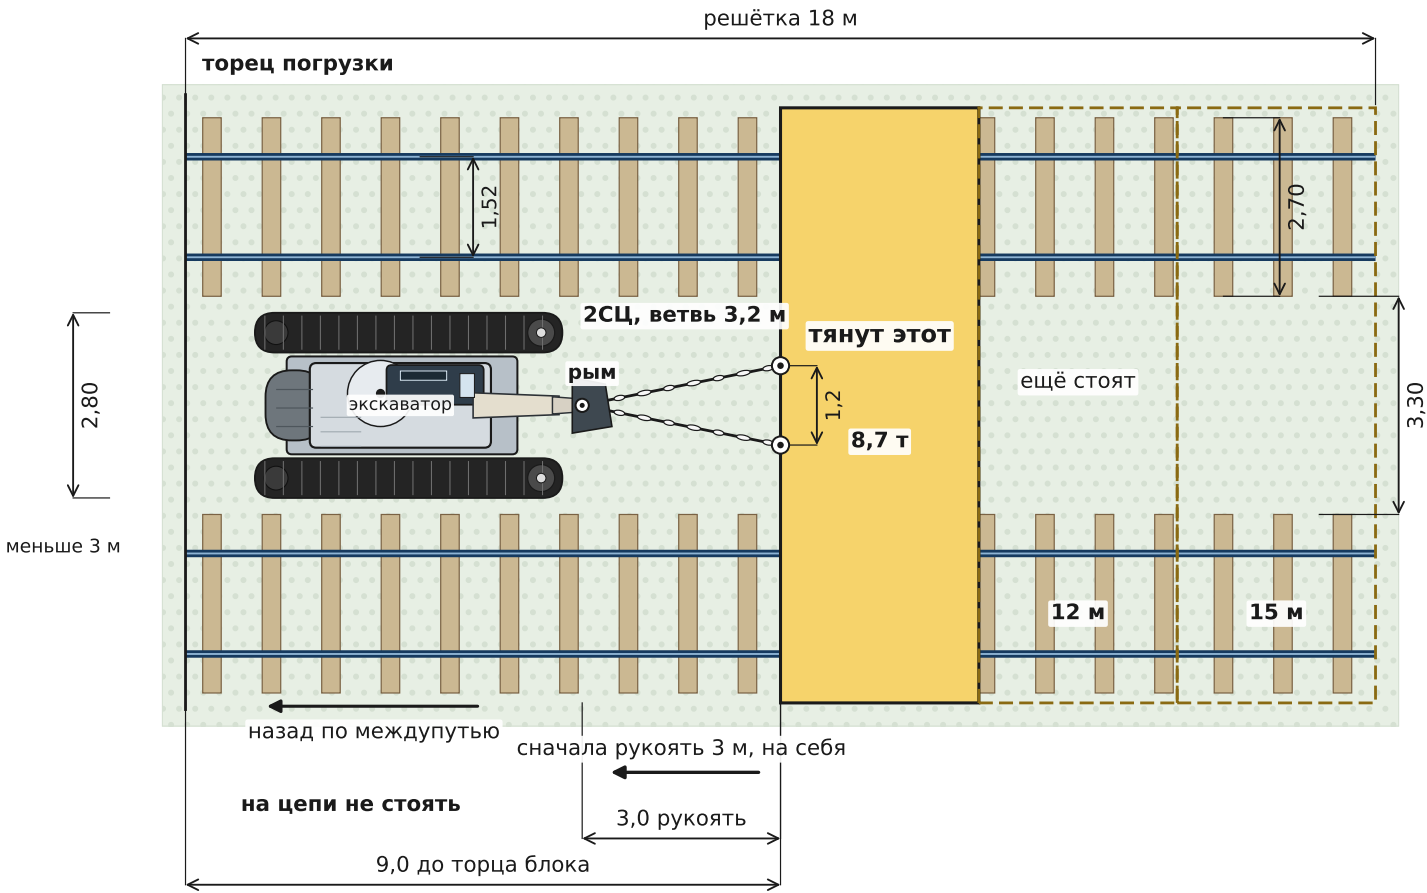

Разрез по машине. Вид с торца погрузки

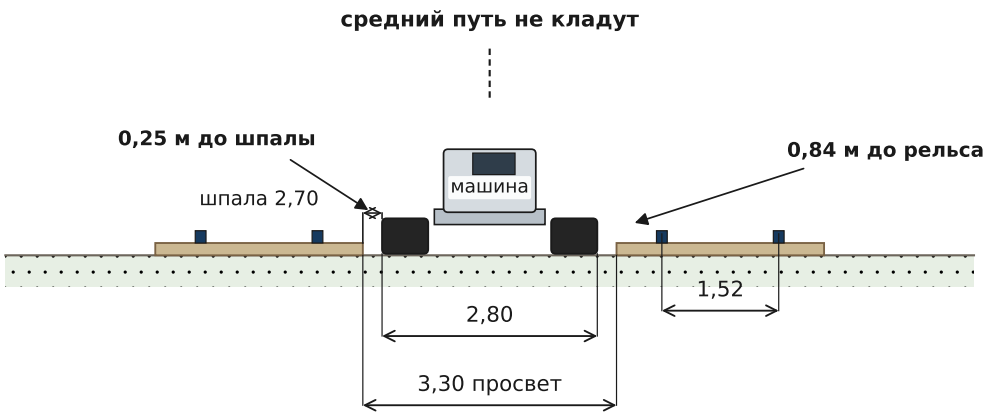


На установке три решётки, шаг 3 м.
На погрузке среднего пути нет.
Между шпалами крайних — 3,30 м.
Машина на рисунке 2,80 м, уже 3 м:
с боков по 0,25 м, до рельса 0,84 м.
Шире 3,30 м в просвет не встаёт.

Сначала рукоять на себя, 3 м,
потом назад по междупутью.
До торца 3 / 6 / 9 / 12 / 15 м,
назад 0 / 3 / 6 / 9 / 12 м.

Строп 2СЦ, цепь 10 мм, класс 8,
на ветвь не меньше 3,15 т.
Ветвь 3,2 м. Рым не меньше 4,6 тс.
За зубья не цепляют, верхние
петли оставляют крану.

Тяга 2,6 тс при 0,30 и 4,4 тс при 0,50.
На ветвь до 2,4 тс. Люди не ближе
3,2 м от цепи и не между машиной и блоком.

Вид сбоку. Тяга на себя, по головкам

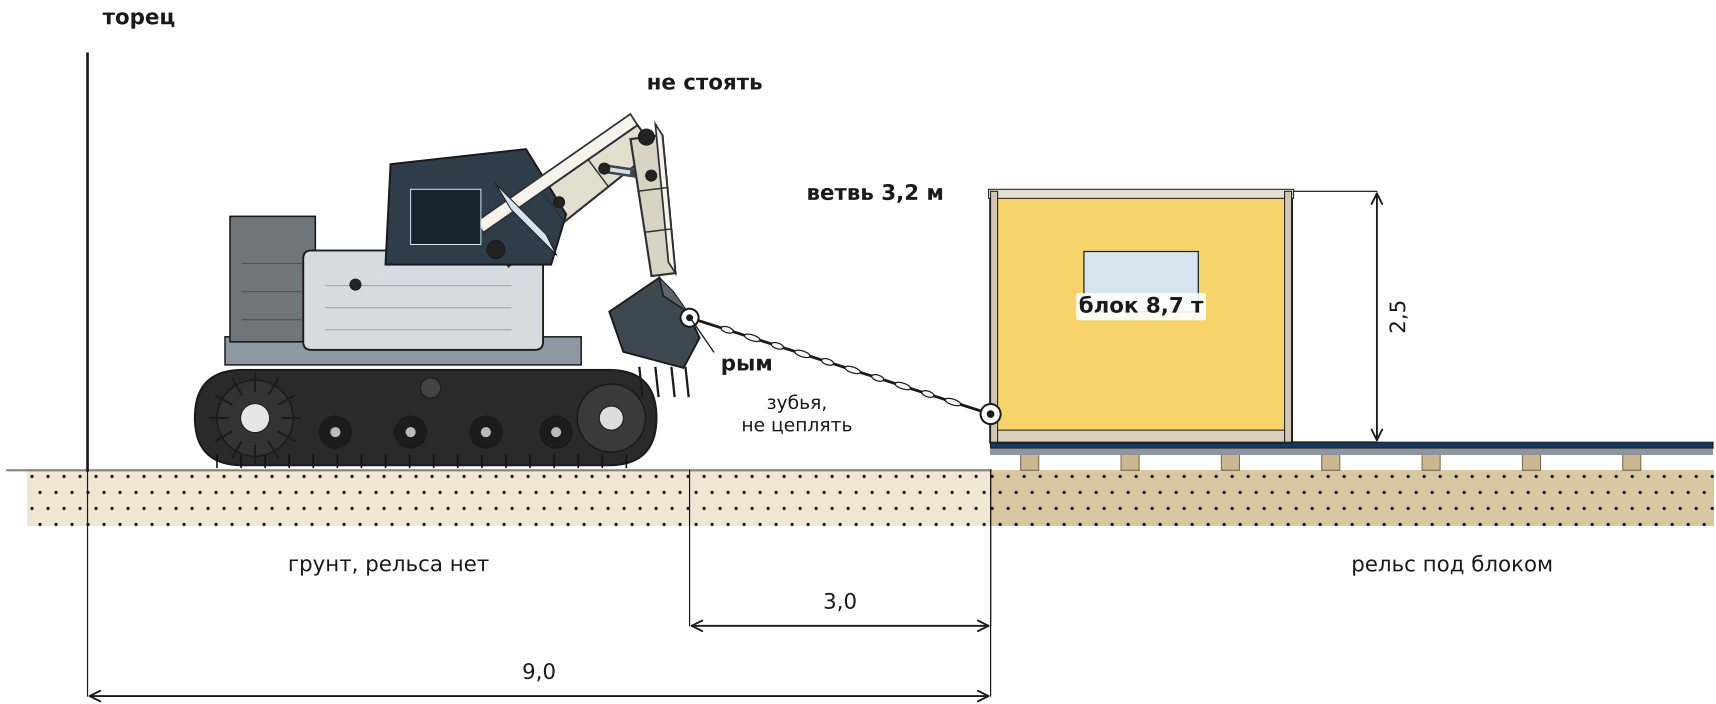

Торец к экскаватору

