


Демонтаж модульного здания. Автокран 25 т, стрела над кабиной, поворот не выполняется. Размеры в метрах.

блок на земле, длинномера нет

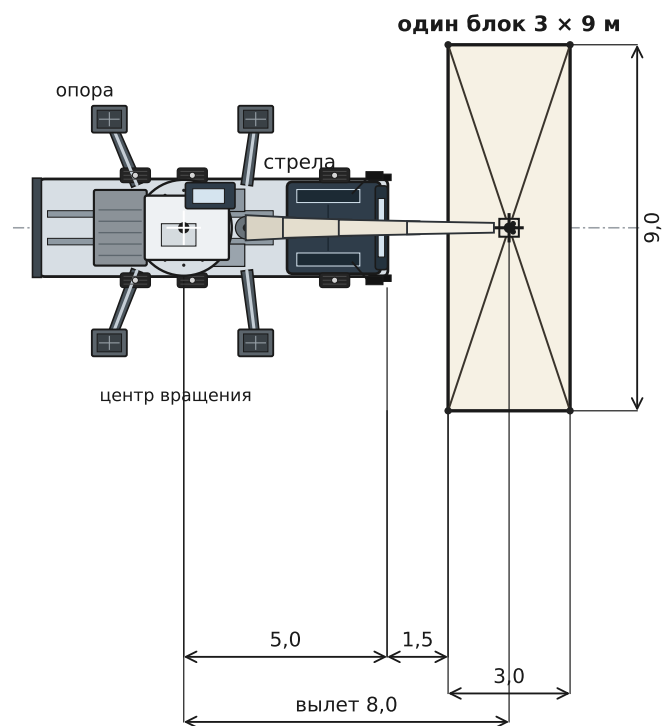

блок на весу, площадка под крюком

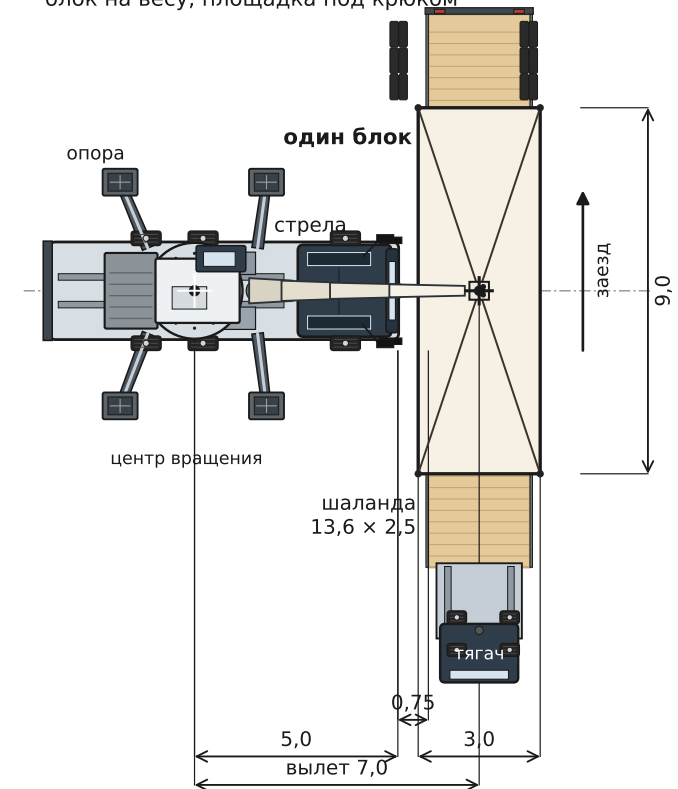


Diagram illustrating the lifting of a block by a truck-mounted crane. The crane arm is extended, and the block is suspended by a rope (строп) from the hook (крюк). The height of the hook above the ground is approximately 10 (около 10). The height of the block is 2,5. The height of the truck chassis is 1,3. The height of the ground is 2,0.

Technical drawing of a truck with a container. The truck has a dark blue cab labeled "тягач" and a yellow container labeled "один блок 3 x 9 x 2,5 м". Dimensions are shown: 2,3 for the cab width, 9,0 for the container length, 2,5 for the container height, and 1,3 for the truck height. The total length of the truck is 13,6, labeled "площадка 13,6".

1. На тяге блока крана в створе нет: стрелу собирают, кран отъезжает. После стопа кран встаёт на место, опоры полностью, и с этой стоянки уже не переезжает.
2. Блок подают в створ стрелы стороной 3 м вдоль стрелы и стороной 9 м поперёк.
3. Подъём — вылет 8,0 м. Затем блок подтягивают стрелой до вылета 7,0 м.
4. Длинномер заводят сбоку под висящий блок. Середина площадки — под крюком.
5. Масса блока 8,7 т, на крюке 9,1 т. Строп 4СЦ, ветвь 8,0 т, длина 7 м. Стрела 14 м. Схема строповки — отдельно.
6. 5,0 м — от центра вращения до передка кабины. На рабочем кране размер сверяют обмером.
