


# Схема передвижки блока экскаватором


Место погрузки: два пути. Блок 3 × 9 × 2,5 м, масса 8,7 т. Машина между путями, тянет только на себя. Размеры в метрах.

План. Два пути, машина между ними, тяга на себя

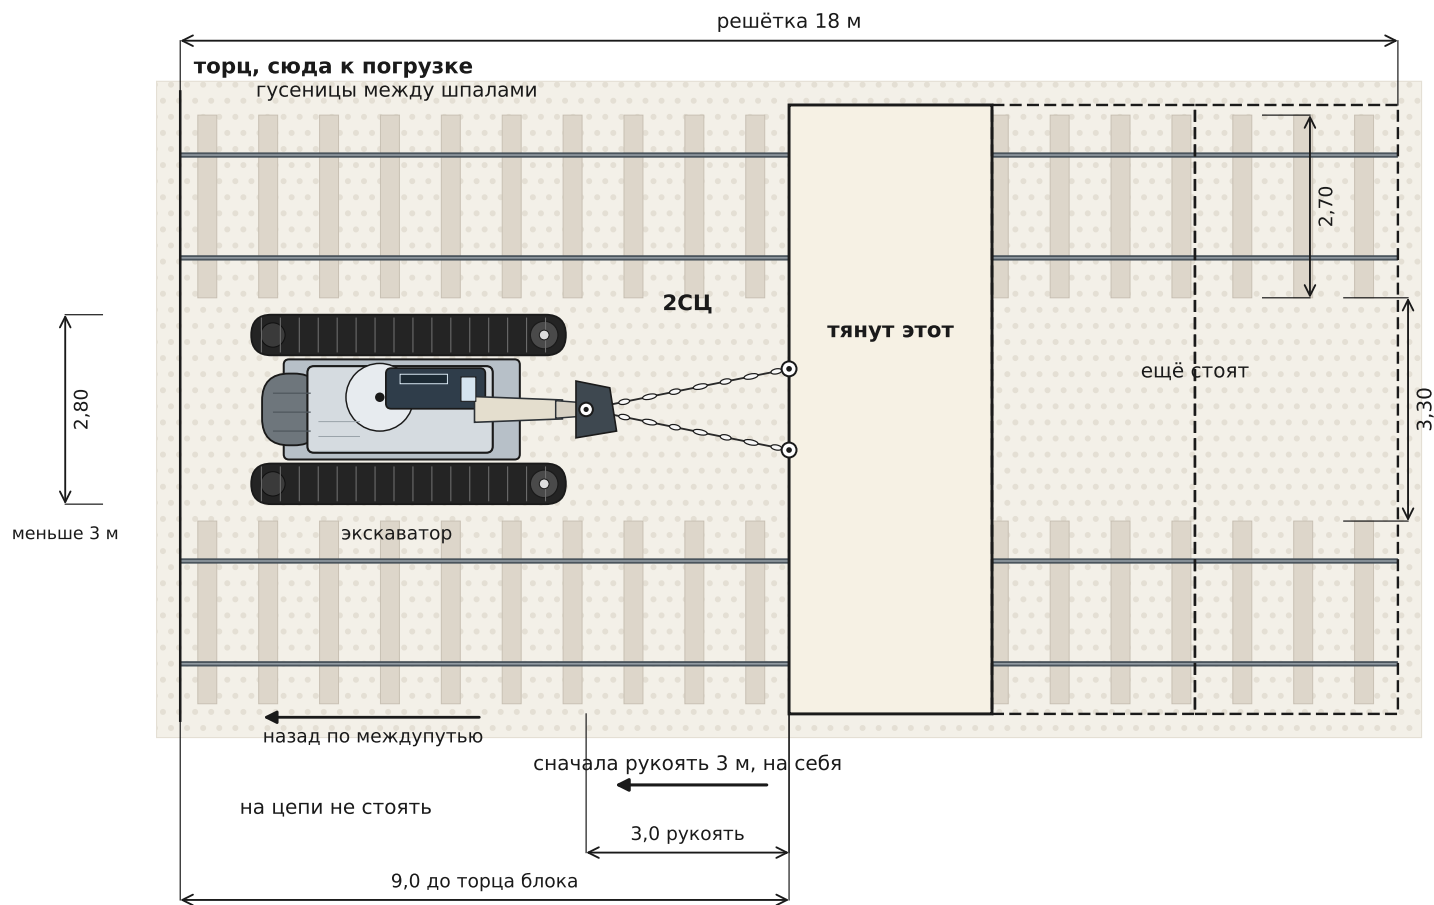

1. На установке три решётки, по одной на каждые 3 м. На погрузке среднего пути нет. Шпала Ш1 — 2,70 м. Между шпалами крайних 3,30 м.
2. Экскаватор уже 3 м: на рисунке 2,80 м. В просвет 3,30 м проходит, с боков по 0,25 м. Тянуть надо до 4,4 тс, не поднимать 8,7 т, машина легче. На шпалы и на рельс не заезжает.
3. Блоки по одному, с ближнего к торцу погрузки. Машина заезжает между путями к его торцу. На листе этот торец в 9 м, рым в 3 м от него.
4. Сначала рукоять на себя, около 3 м. Дальше машина сдаёт назад по междупутью, блок идёт за ковшом по головкам двух путей. Цепь не удлиняют. Ход ковша сверяют с паспортом. По грунту блок не тащат.
5. До торца, м: 3 6 9 12 15  
рукоятью, м: 3 3 3 3 3  
назад, м: 0 3 6 9 12  
Блок, который уже у торца, не тянут.
6. Строп 2СЦ, цепь 10 мм класса 8, на ветвь не меньше 3,15 т. Две точки на нижнем поясе торца, по центру, между ними 1,2 м. На рым ковша. Рым по паспорту не меньше 4,6 тс. За зубья не цепляют. Верхние петли оставляют крану.
7. На листе ветвь 3,2 м, и на ближнем, и на дальнем блоке она такая же: машина подъезжает, а не достаёт с торца длинной цепью.
8. Сила от длины цепи не растёт.  $8,7 \text{ т} \times 0,30 = 2,6 \text{ тс}$ , при 0,50 будет 4,4 тс на блок. С наклоном ветви на листе на ветвь до 2,4 тс.
9. При обрыве цепь бьёт на свою длину. Люди не ближе 3,2 м от линии цепи и не стоят между машиной и блоком.

Вид сбоку. Машина между путями, тяга на себя

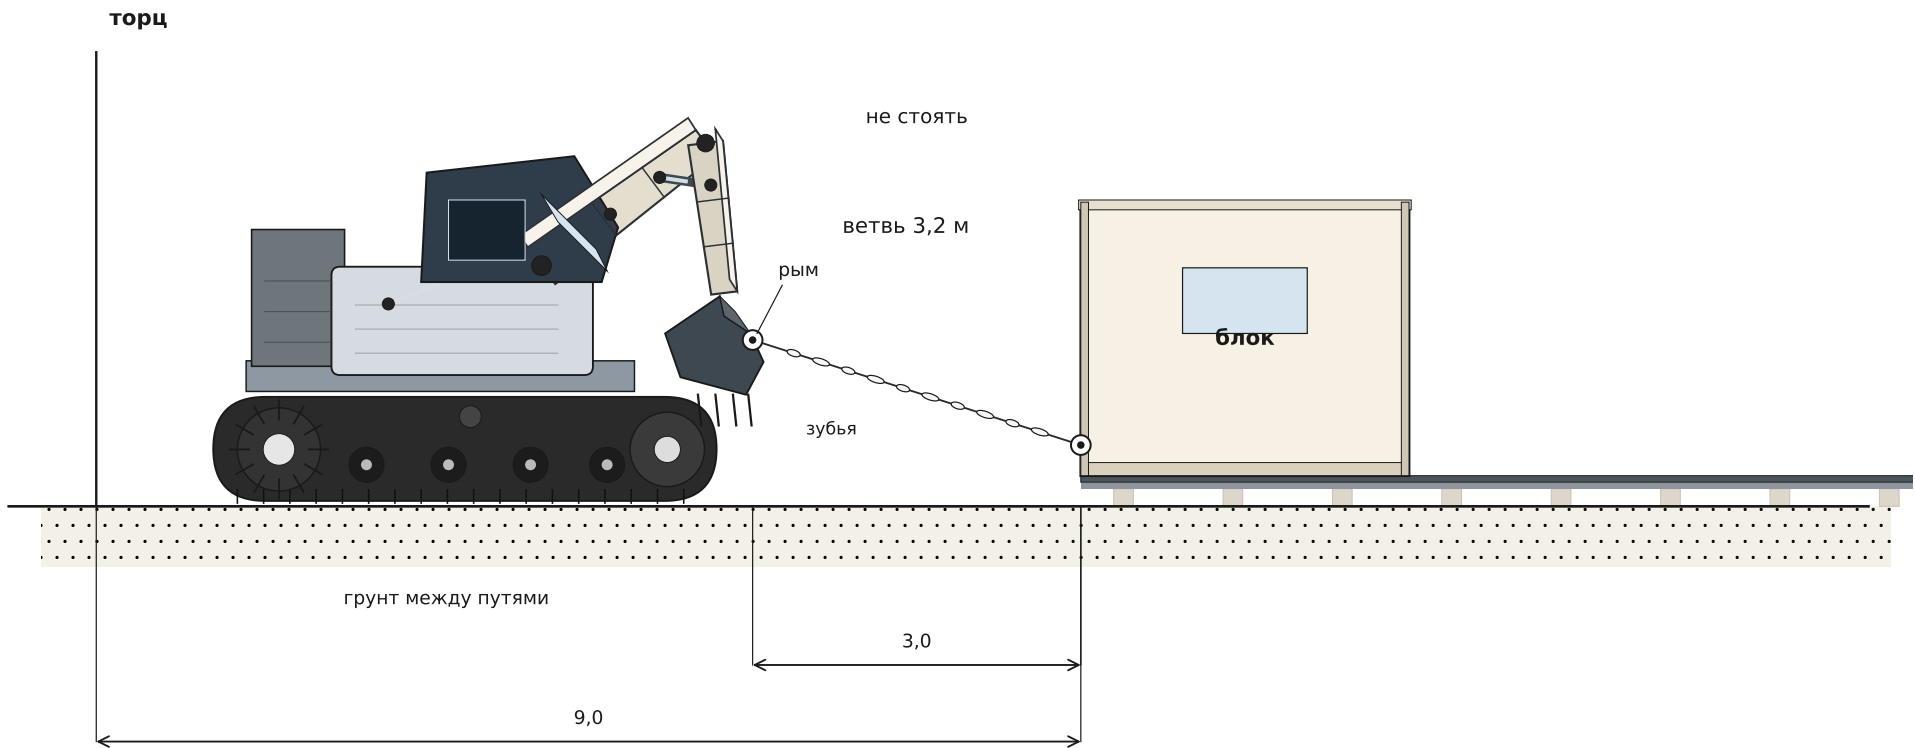

Торец к экскаватору

