



Схема установки блоков на новую площадку

Шесть блоков 3 × 9 × 2,5 м, масса каждого 8,7 т. Размеры в метрах.

План. Шесть мест на путях

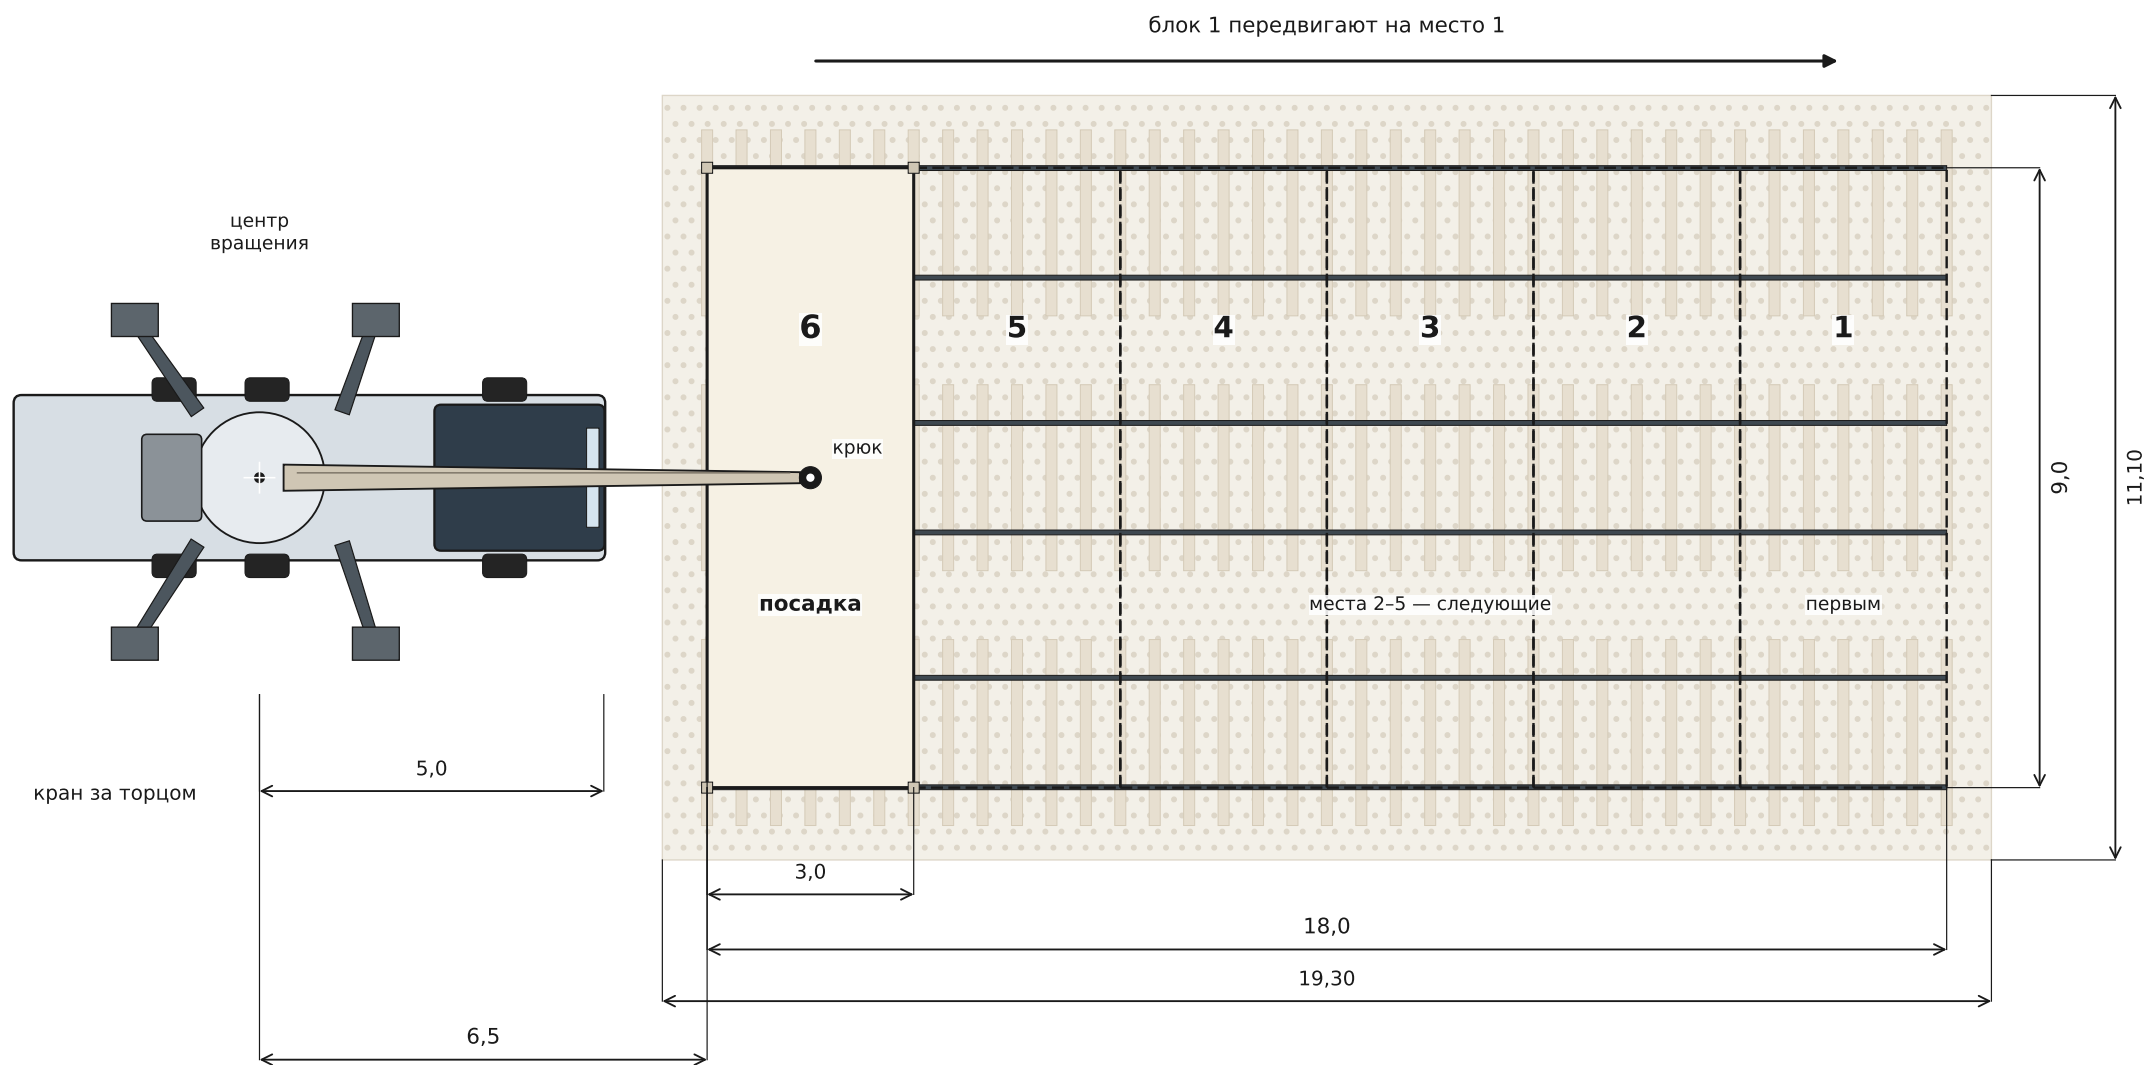

Посадка блока на рельсы

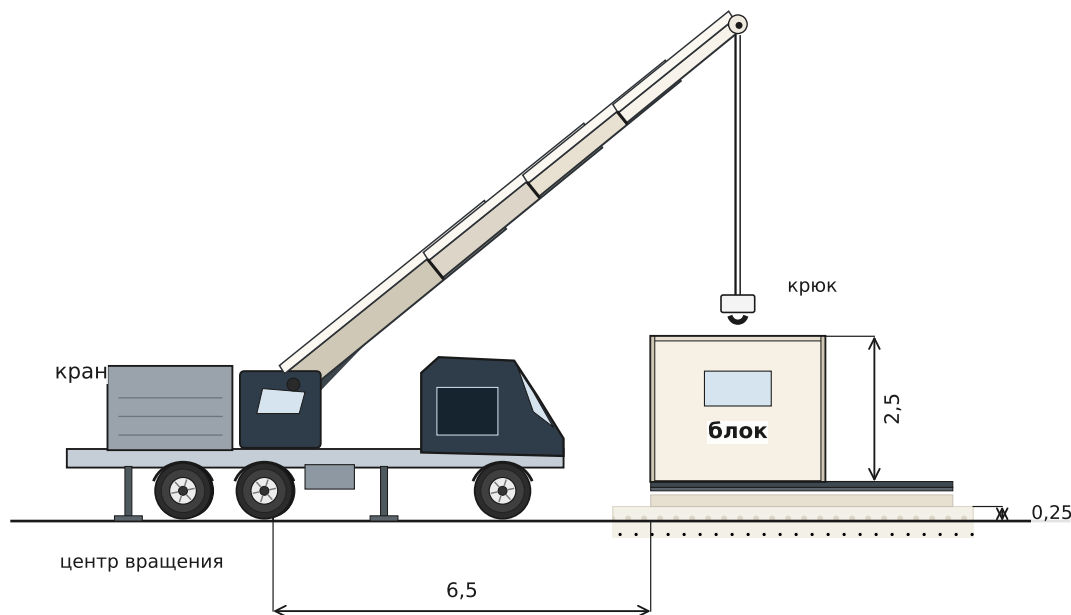

1. Пути и щебень — по схеме площадки. Три пути, колея 1520 мм.
2. Кран ставят с торца, за площадкой. Центр вращения — в 6,5 м от начала рельсов. Опоры полностью. Стрела только вперёд над кабиной. 5,0 м до переда кабины сверяют обмером. На посадке кран с этой стоянки не переезжает.
3. Блок опускают на головки рельсов: 3 м вдоль путей, 9 м поперёк. Середина блока — вылет 8,0 м. Строп 4СЦ — по схеме строповки. Длинномер подают и убирают по схеме крана.
4. После посадки кран собирает стрелу и уходит со створа. Блок передвигают по рельсам на своё место. Экскаватор стоит дальше по ходу и тянет блок к себе, по схеме передвижки.
5. Первым уходит место 1, дальний торец. Последним ставят место 6, оно остаётся у крана. Блоки ставят вплотную, торец к торцу. В сборе модуль 18 × 9 м.
