



Схема установки блоков на новую площадку

Шесть блоков 3 × 9 × 2,5 м, масса каждого 8,7 т. Кран сбоку, стрела вдоль блока. Размеры в метрах.

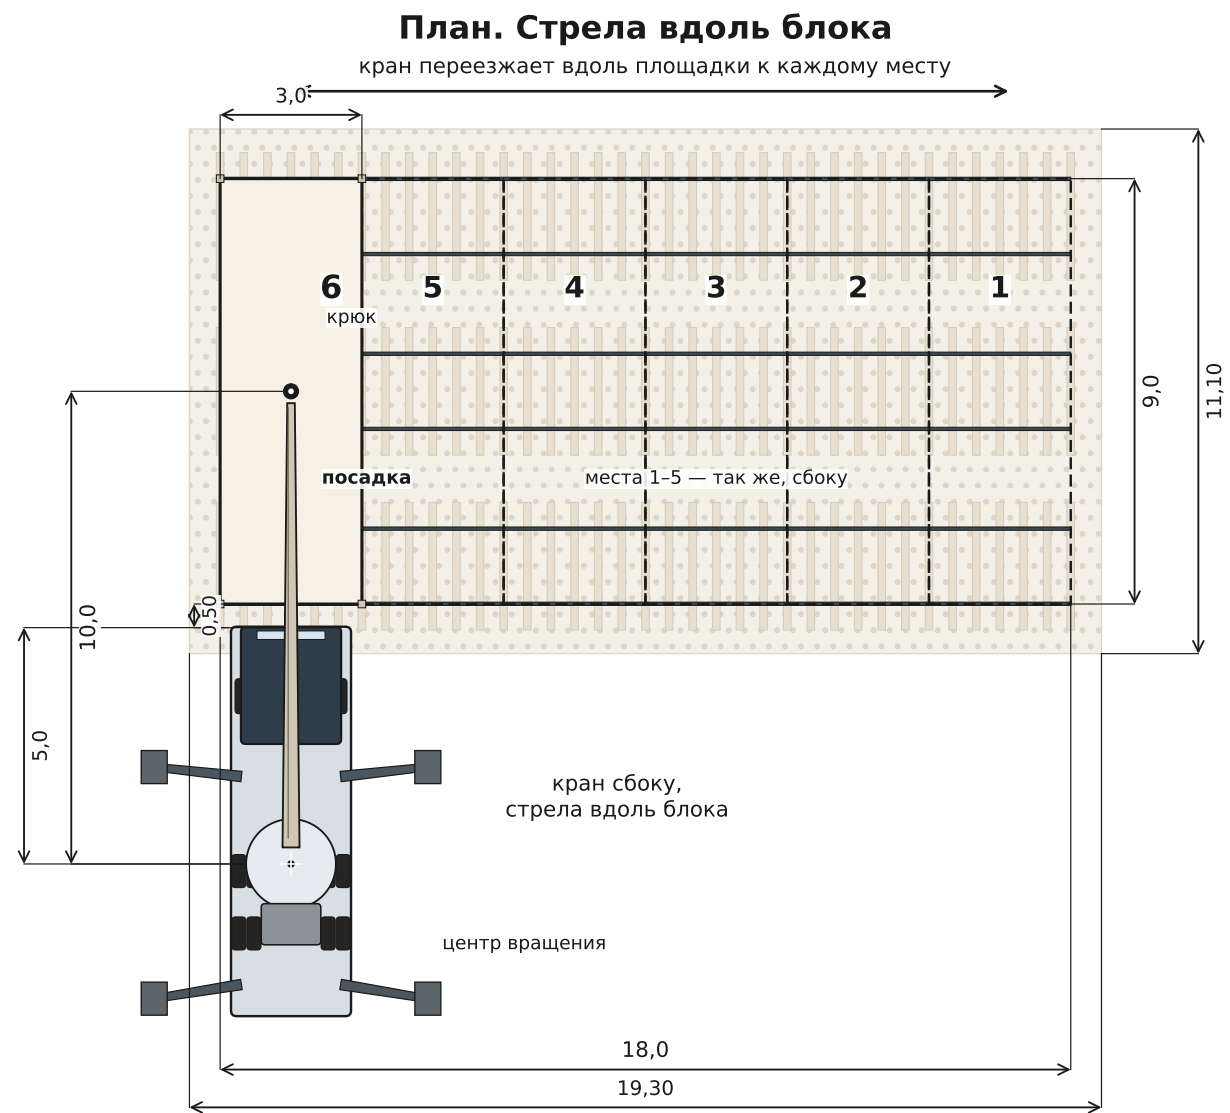

Поперечник. Стрела вдоль блока

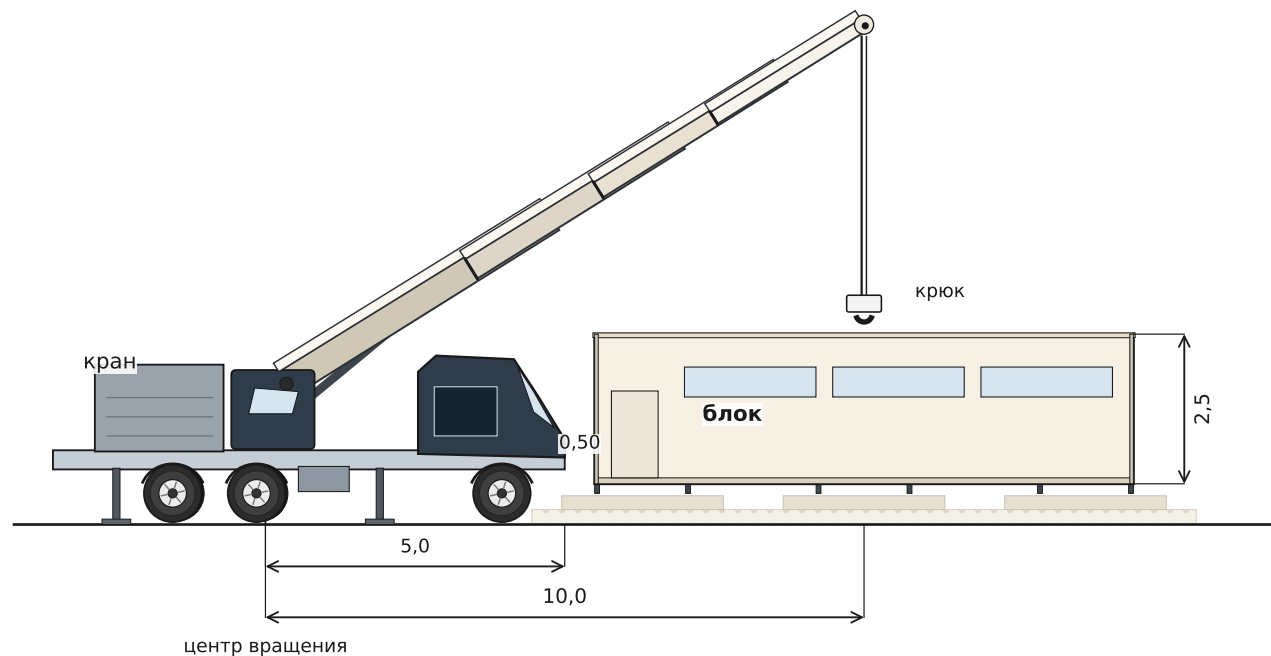

1. Колея КамАЗ-65115: передние колёса 2,05 м, задние 1,89 м между серединами двойных скатов. Ширина крана 2,50 м. Шпала Ш1 — 2,70 м. Шпала длиннее колеи: между колёсами она не встаёт. Просвет между торцами шпал 1,00 м, уже крана. На путь и в междупутье кран не ставят.
2. Кран стоит сбоку площадки, за торцами шпал. Опоры полностью, на грунте у бровки. Стрела только вперёд над кабиной, вдоль блока: 9 м по вылету, 3 м поперёк стрелы.
3. 5,0 м до переда кабины сверяют обмером. Зазор кабины до ближней грани 0,50 м. Середина блока — вылет 10,0 м, дальняя грань 14,5 м. На крюке 9,1 т, момент 91 т·м. У КС-55713 момент 80 т·м. На стреле 14 м при вылете 8 м ещё около 9,9 т. Вылет 10 м этим грузом паспорт не принимает.
4. К каждому месту кран переезжает вдоль площадки со собранной стрелой. На посадке с стоянки не переезжает. Блок опускают на головки. Строп 4СЦ — по схеме строповки. Блоки вплотную. В сборе модуль 18 × 9 м.
