


Схема установки блоков на новую площадку

Шесть блоков 3 × 9 × 2,5 м, по 8,7 т. Кран перпендикулярно площадке, берёт справа по стороне 9 м. Размеры в метрах.



Посадка. Стрела над задом, вдоль стороны 9 м

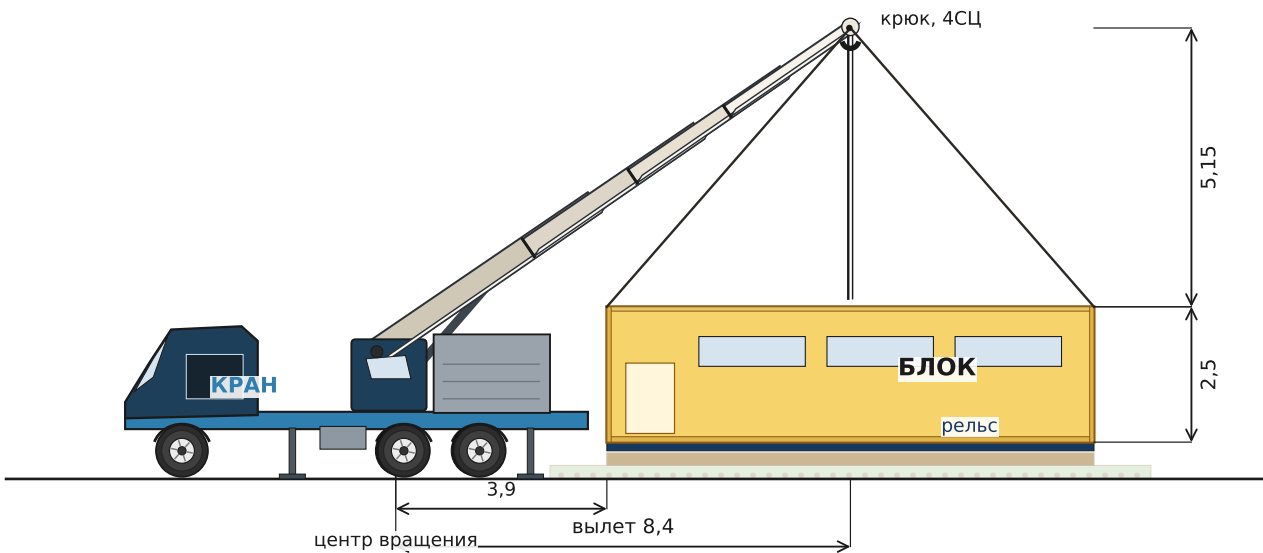

1. Кран встаёт напротив блока, шасси перпендикулярно площадке. Кабина смотрит от площадки, зад — к блоку. Опоры полностью, контур 5,1 × 6,1 м. На шпалы и на щебень тарелки не ставят.
2. Шаланда справа, перпендикулярно крану. Ближний торец в 3,9 м от оси крана. Вылет до середины груза на ней — 8,4 м. Блок подают, 9 м вдоль шаланды, стрела берёт по этой стороне.
3. Стрела возвращается на площадку тем же вылетом. На крюке 9,1 т. Стрела 14 м, зона над задом: на 8 м — 9,9 т, на 8,4 м около 9,4 т. Над кабиной этот блок не несут.
4. Ближняя грань блока 3,9 м от оси, середина — вылет 8,4 м, дальняя 12,9 м. Если промер дал больше 8,5 м, стоянку не используют. Строп 4СЦ, ветвь 7 м, на ветвь 3,0 т при допускаемых 8 т.
5. На площадке 9 м ложатся поперёк путей, 3 м — вдоль. Блок поворачивается вместе со стрелой. Дальше кран переезжает на 3 м к следующему блоку и повторяет то же. Так все шесть.
